

ALLEGATO "A"

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di n. 1144 casettoni lungo il muro di cinta ad ovest della zona di ampliamento del cimitero comunale.

COMMITTENTE: Comune di Molfetta - Settore L.L.P.P.

CANTIERE: Cimitero Comunale, Molfetta (Bari)

Molfetta, 06/08/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Losito Michele)

per presa visione


IL COMMITTENTE

(Geometra Binetti Damiano)

Ingegnere Losito Michele
70056 Molfetta (Bari)


CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Mese 1						Mese 2	
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	
Opere Edili	296 g	▼							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	Z1							
Realizzazione della viabilità del cantiere	4 g		Z1						
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di	4 g		Z1						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g		Z1						
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic	2 g		Z1						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g		Z1						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g			Z1					
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego	14 g			Z1	Z1	Z1			
Scavo di sbancamento	15 g							Z1	Z1
Scavo a sezione obbligata	5 g								
Rinterro di scavo	5 g								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	15 g								
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g								
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	15 g								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic	85 g								
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	85 g								
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	88 g								
Realizzazione di tompagnature	98 g								
Formazione di massetto per pavimenti interni	33 g								
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	64 g								
Posa di rivestimenti esterni	75 g								
Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisistr	15 g								
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	58 g								
Impermeabilizzazione di coperture	44 g								
Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche	16 g								
Posa di ringhiere e parapetti	75 g								
Posa di serramenti esterni	80 g								
Posa di elementi ferrosi e similari	46 g								
Tinteggiatura di superfici esterne	94 g								
Sistemazione Area Esterna - Arredi	26 g								
Posa di elementi ferrosi e similari	16 g								
Formazione di manto di usura e collegamento	20 g								
Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto	20 g								

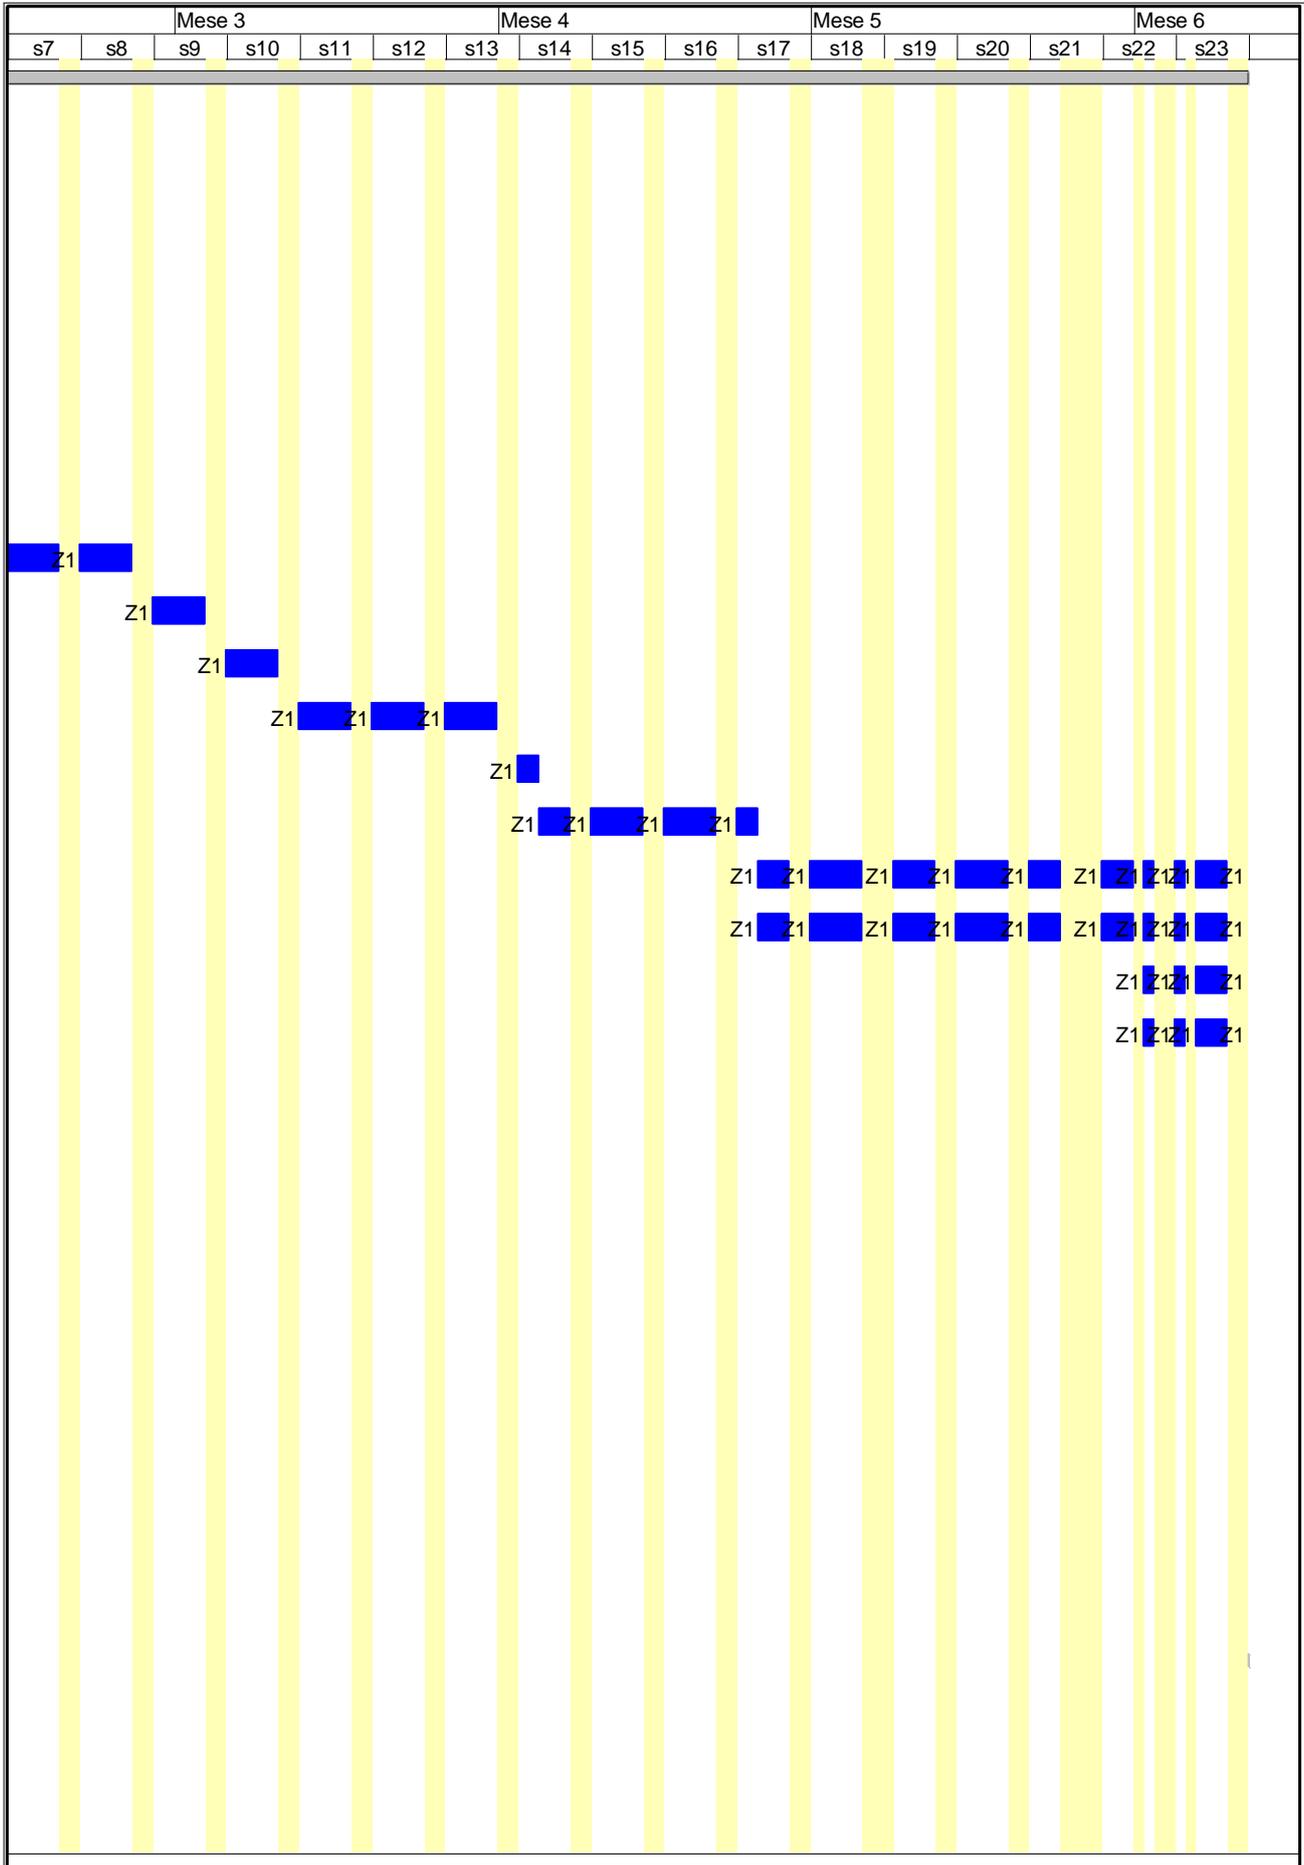

Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				
s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23

			Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10	
s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40
			Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1
			Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1

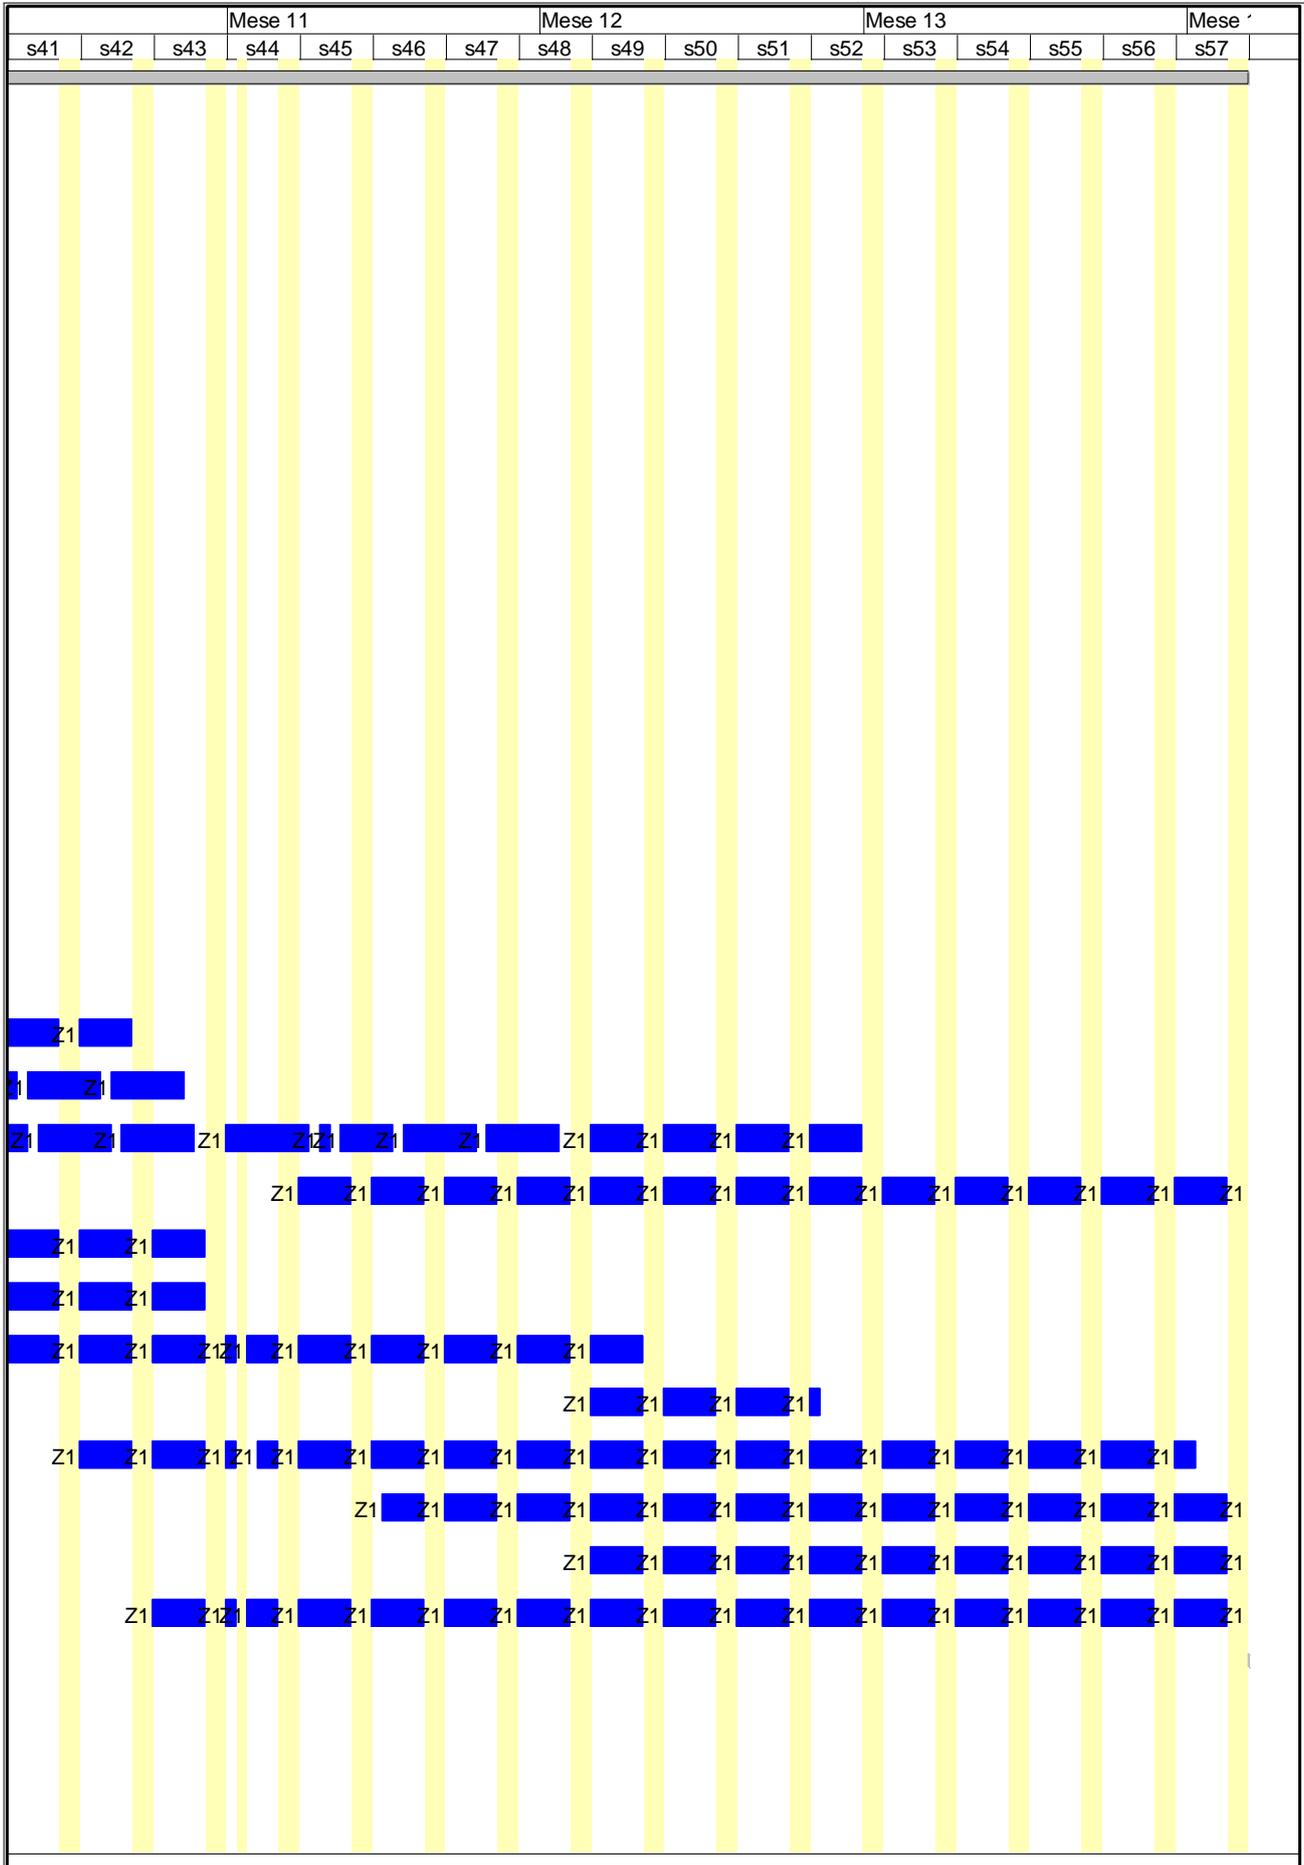

Mese 11			Mese 12				Mese 13				Mese 14					
s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56	s57
Z1	Z1	Z1														
Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1
												Z1	Z1	Z1	Z1	Z1

