



**COMUNE DI MOLFETTA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI BARI**

---

**UFFICIO TECNICO**

**PIANO STRADE**

**Progetto esecutivo manutenzione straordinaria  
di strade e marciapiedi della città**

**LOTTO n.1 STRADE BITUMATE**

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enzo Balducci

i tecnici

Ing. Luca Lucanie

geom. Damiano Binetti

p.i. Giuseppe Sgherza

Assistente al R.U.P.:

geom. Stefano Spaccavento

**CRONOPROGRAMMA DI GANT**

**PSC/A**

---

L'assessore ai LL.PP.

Avv. Mariano Caputo

il Sindaco

Tommaso Minervini

# ALLEGATO "A"

**Comune di MOLFETTA**

Provincia di BARI

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori stradali di rifacimento del manto d'usura delle strade pubbliche del Comune di Molfetta Lotto 1.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MOLFETTA.

**CANTIERE:** LOTTO 1 , MOLFETTA (BARI)

MOLFETTA, 14/09/2018

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(geometra De Gennaro Michele)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(Responsabile unico del procedimento Balducci Vincenzo)

**geometra De Gennaro Michele**

Via Martiri di Via Fani

70056 Molfetta (Bari)

Tel.: \$EMPTY\_CSP\_09\$ - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$

E-Mail: \$EMPTY\_CSP\_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C
<b>LOTTO 1 - ZONA A</b>			
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Area Lavorazione)	1	1	1
	32	1	1
	19	1	1
	20	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	36	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (area carico/scarico)	4	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	4	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	4	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	4	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	4	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	4	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>			
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	2	2
	32	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	36	2	2
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	2	2
	32	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2

**Tabella Analitica Gantt**

	6	2	2
	36	2	2
Demolizione di fondazione stradale	1	2	2
	32	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	36	2	2
Demolizione di misto cemento	1	2	2
	32	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	36	2	2
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	2	2
	32	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	36	2	2
<b>Opere d'arte</b>			
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1
	32	1	1
	19	1	1
	20	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	36	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	1
	32	1	1

**Tabella Analitica Gantt**

	19	1	1
	20	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	36	1	1
<b>Sede stradale</b>			
Formazione di manto di usura e collegamento	1	2	2
	32	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	36	2	2
<b>Smobilizzo del cantiere</b>			
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1
	32	1	1
	19	1	1
	20	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	36	1	1
Smobilizzo del cantiere	1	1	1
	32	1	1
	19	1	1
	20	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	36	1	1
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	4	1	1
<b>LOTTO 1 - ZONA B</b>			
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	21	1	1
	2	1	1

**Tabella Analitica Gantt**

	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	28	1	1
	29	1	1
	27	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (area carico/scarico)	4	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	4	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	4	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	4	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	4	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	4	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>			
Asportazione di strato di usura e collegamento	21	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	28	2	2
	29	2	2
	27	2	2
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	21	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	28	2	2
	29	2	2
	27	2	2
Demolizione di fondazione stradale	21	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	28	2	2
	29	2	2
	27	2	2
Demolizione di misto cemento	21	2	2

**Tabella Analitica Gantt**

	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	28	2	2
	29	2	2
	27	2	2
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	21	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	28	2	2
	29	2	2
	27	2	2
<b>Opere d'arte</b>			
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	21	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	28	1	1
	29	1	1
	27	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	21	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	28	1	1
	29	1	1
	27	1	1
<b>Sede stradale</b>			
Formazione di manto di usura e collegamento	21	2	2
	2	2	2
	3	2	2
	4	2	2
	5	2	2
	6	2	2
	28	2	2
	29	2	2

**Tabella Analitica Gantt**

	27	2	2
<b>Smobilizzo del cantiere</b>			
Pulizia generale dell'area di cantiere	21	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	28	1	1
	29	1	1
	27	1	1
Smobilizzo del cantiere	21	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	28	1	1
	29	1	1
	27	1	1
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	4	1	1
<b>LOTTO 1 - ZONA C</b>			
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	21	1	1
	33	1	1
	22	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1
	10	1	1
	37	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (area carico/scarico)	33	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	33	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	33	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	33	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	33	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	33	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	33	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	33	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>			
Asportazione di strato di usura e collegamento	21	2	2
	33	2	2
	22	2	2
	7	2	2



**Tabella Analitica Gantt**

	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	37	2	2
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	21	2	2
	33	2	2
	22	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	37	2	2
Demolizione di fondazione stradale	21	2	2
	33	2	2
	22	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	37	2	2
Demolizione di misto cemento	21	2	2
	33	2	2
	22	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	37	2	2
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	21	2	2
	33	2	2
	22	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	37	2	2
<b>Opere d'arte</b>			
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	21	1	1
	33	1	1
	22	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1
	10	1	1
	37	1	1

**Tabella Analitica Gantt**

Cordoli, zanelle e opere d'arte	21	1	1
	33	1	1
	22	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1
	10	1	1
	37	1	1
<b>Sede stradale</b>			
Formazione di manto di usura e collegamento	21	2	2
	33	2	2
	22	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	37	2	2
<b>Smobilizzo del cantiere</b>			
Pulizia generale dell'area di cantiere	21	1	1
	33	1	1
	22	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1
	10	1	1
	37	1	1
Smobilizzo del cantiere	21	1	1
	33	1	1
	22	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1
	10	1	1
	37	1	1
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	33	1	1
<b>LOTTO 1 - ZONA D</b>			
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	18	1	1
	31	1	1
	30	1	1
	19	1	1
	20	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1

**Tabella Analitica Gantt**

	10	1	1
	11	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (area carico/scarico)	10	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	10	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	10	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	10	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	10	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	10	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	10	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	10	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>			
Asportazione di strato di usura e collegamento	18	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	11	2	2
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	18	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	11	2	2
Demolizione di fondazione stradale	18	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	11	2	2
Demolizione di misto cemento	18	2	2
	31	2	2
	30	2	2

**Tabella Analitica Gantt**

	19	2	2
	20	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	11	2	2
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	18	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	7	2	2
	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	11	2	2
<b>Opere d'arte</b>			
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	18	1	1
	31	1	1
	30	1	1
	19	1	1
	20	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1
	10	1	1
	11	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	18	1	1
	31	1	1
	30	1	1
	19	1	1
	20	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1
	10	1	1
	11	1	1
<b>Sede stradale</b>			
Formazione di manto di usura e collegamento	18	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	7	2	2

**Tabella Analitica Gantt**

	8	2	2
	9	2	2
	10	2	2
	11	2	2
<b>Smobilizzo del cantiere</b>			
Pulizia generale dell'area di cantiere	18	1	1
	31	1	1
	30	1	1
	19	1	1
	20	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1
	10	1	1
	11	1	1
Smobilizzo del cantiere	18	1	1
	31	1	1
	30	1	1
	19	1	1
	20	1	1
	7	1	1
	8	1	1
	9	1	1
	10	1	1
	11	1	1
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	10	1	1
<b>LOTTO 1 - ZONA E</b>			
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	15	1	1
	16	1	1
	20	1	1
	26	1	1
	19	1	1
	31	1	1
	30	1	1
	34	1	1
	24	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (area carico/scarico)	34	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	34	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	34	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	34	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>			

**Tabella Analitica Gantt**

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	34	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	34	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	34	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	34	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>			
Asportazione di strato di usura e collegamento	12	2	2
	13	2	2
	14	2	2
	15	2	2
	16	2	2
	20	2	2
	26	2	2
	19	2	2
	25	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	34	2	2
	24	2	2
	Taglio di asfalto di carreggiata stradale	12	2
13		2	2
14		2	2
15		2	2
16		2	2
20		2	2
26		2	2
19		2	2
25		2	2
31		2	2
30		2	2
34		2	2
24		2	2
Demolizione di fondazione stradale		12	2
	13	2	2
	14	2	2
	15	2	2
	16	2	2
	20	2	2
	26	2	2
	19	2	2
	25	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	34	2	2
	24	2	2
	Demolizione di misto cemento	12	2

**Tabella Analitica Gantt**

	13	2	2
	14	2	2
	15	2	2
	16	2	2
	20	2	2
	26	2	2
	19	2	2
	25	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	34	2	2
	24	2	2
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	12	2	2
	13	2	2
	14	2	2
	15	2	2
	16	2	2
	20	2	2
	26	2	2
	19	2	2
	25	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	34	2	2
	24	2	2
<b>Opere d'arte</b>			
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	15	1	1
	16	1	1
	20	1	1
	26	1	1
	19	1	1
	25	1	1
	31	1	1
	30	1	1
	34	1	1
	24	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	15	1	1
	16	1	1
	20	1	1

**Tabella Analitica Gantt**

	26	1	1
	19	1	1
	25	1	1
	31	1	1
	30	1	1
	34	1	1
	24	1	1
<b>Sede stradale</b>			
Formazione di manto di usura e collegamento	12	2	2
	13	2	2
	14	2	2
	15	1	1
	16	2	2
	20	2	2
	26	2	2
	19	2	2
	25	2	2
	31	2	2
	30	2	2
	34	2	2
	24	2	2
<b>Smobilizzo del cantiere</b>			
Pulizia generale dell'area di cantiere	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	15	1	1
	16	1	1
	20	1	1
	26	1	1
	19	1	1
	25	1	1
	31	1	1
	30	1	1
	34	1	1
	24	1	1
Smobilizzo del cantiere	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	15	1	1
	16	1	1
	20	1	1
	26	1	1
	19	1	1
	25	1	1
	31	1	1



**Tabella Analitica Gantt**

	30	1	1
	34	1	1
	24	1	1
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	34	1	1
<b>LOTTO 1 - ZONA F</b>			
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	21	1	1
	22	1	1
	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	23	1	1
	11	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (area carico/scarico)	35	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	35	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	35	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	35	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	35	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	35	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	35	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	35	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>			
Asportazione di strato di usura e collegamento	21	2	2
	22	2	2
	12	2	2
	13	2	2
	14	2	2
	23	2	2
	11	2	2
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	21	2	2
	22	2	2
	12	2	2
	13	2	2
	14	2	2
	23	2	2
	11	2	2
Demolizione di fondazione stradale	21	2	2
	22	2	2
	12	2	2
	13	2	2
	14	2	2
	23	2	2
	11	2	2
Demolizione di misto cemento	21	2	2

**Tabella Analitica Gantt**

	22	2	2
	12	2	2
	13	2	2
	14	2	2
	23	2	2
	11	2	2
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	21	2	2
	22	2	2
	12	2	2
	13	2	2
	14	2	2
	23	2	2
	11	2	2
<b>Opere d'arte</b>			
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	21	1	1
	22	1	1
	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	23	1	1
	11	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	21	1	1
	22	1	1
	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	23	1	1
	11	1	1
<b>Sede stradale</b>			
Formazione di manto di usura e collegamento	21	2	2
	22	2	2
	12	2	2
	13	2	2
	14	2	2
	23	2	2
	11	2	2
<b>Smobilizzo del cantiere</b>			
Pulizia generale dell'area di cantiere	21	1	1
	22	1	1
	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	23	1	1
	11	1	1
Smobilizzo del cantiere	21	1	1

**Tabella Analitica Gantt**

	22	1	1
	12	1	1
	13	1	1
	14	1	1
	23	1	1
	11	1	1
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	35	1	1
<b>LOTTO 1 - ZONA G</b>			
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	39	1	1
	38	1	1
	40	1	1
	41	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (area carico/scarico)	38	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	38	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	38	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	38	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	38	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	38	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	38	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	38	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>			
Asportazione di strato di usura e collegamento	39	2	2
	38	2	2
	40	2	2
	41	2	2
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	39	2	2
	38	2	2
	40	2	2
	41	2	2
Demolizione di fondazione stradale	39	2	2
	38	2	2
	40	2	2
	41	2	2
Demolizione di misto cemento	39	2	2
	38	2	2
	40	2	2
	41	2	2
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	39	2	2
	38	2	2
	40	2	2
	41	2	2
<b>Opere d'arte</b>			
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	39	1	1

**Tabella Analitica Gantt**

	38	1	1
	40	1	1
	41	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	39	1	1
	38	1	1
	40	1	1
	41	1	1
<b>Sede stradale</b>			
Formazione di manto di usura e collegamento	39	2	2
	38	2	2
	40	2	2
	41	2	2
<b>Smobilizzo del cantiere</b>			
Pulizia generale dell'area di cantiere	39	1	1
	38	1	1
	40	1	1
	41	1	1
Smobilizzo del cantiere	39	1	1
	38	1	1
	40	1	1
	41	1	1
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	38	1	1
<b>LOTTO 1 - ZONA H</b>			
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	43	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (area carico/scarico)	42	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	42	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	42	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	42	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	42	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	42	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	42	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	42	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>			
Asportazione di strato di usura e collegamento	43	2	3
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	43	2	3
Demolizione di fondazione stradale	43	2	3
Demolizione di misto cemento	43	2	3
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	43	2	3
<b>Opere d'arte</b>			
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	43	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	43	1	1
<b>Sede stradale</b>			
Formazione di manto di usura e collegamento	43	2	2

**Tabella Analitica Gantt**

<b>Smobilizzo del cantiere</b>			
Pulizia generale dell'area di cantiere	43	1	1
Smobilizzo del cantiere	43	1	1
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	42	1	1
<b>LOTTO 1 - ZONA I</b>			
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	44	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (area carico/scarico)	45	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	45	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	45	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	45	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	45	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	45	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	45	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	45	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>			
Asportazione di strato di usura e collegamento	44	2	2
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	44	2	2
Demolizione di fondazione stradale	44	2	2
Demolizione di misto cemento	44	2	2
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	44	2	2
<b>Opere d'arte</b>			
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	44	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	44	1	1
<b>Sede stradale</b>			
Formazione di manto di usura e collegamento	44	2	2
<b>Smobilizzo del cantiere</b>			
Pulizia generale dell'area di cantiere	44	1	1
Smobilizzo del cantiere	44	1	1
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	45	1	1

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

- 1) = Strada 2: Via Paniscotti
- 2) = Strada 4: Via C. Alberto
- 3) = Strada 5: Via Magenta
- 4) = Strada 6: Via Solferino
- 5) = Strada 7: Via P. Colletta
- 6) = Strada 8: Via Paradiso
- 7) = Strada 9: Via nino Bixio
- 8) = Strada 10: Via P. Matteucci
- 9) = Strada 11: Via C. Colombo

- 10) = Strada 12: Via D. Manin
- 11) = Strada 13: Via Cappellini
- 12) = Strada 14: Via G. Bruno
- 13) = Strada 15: Via R. Picca
- 14) = Strada 16: Via Capotorti
- 15) = Strada 17: Via C. Pisacane
- 16) = Strada 18: Via Foggia
- 17) = Strada 19: Via Palestro
- 18) = Strada 20: Via Immacolata
- 19) = Strada 21: Via Pia
- 20) = Strada 22: Via Manzoni
- 21) = Strada 23: Via Pappalepore
- 22) = Strada 24: Via A. Saffi
- 23) = Strada 26: Via Zuppetta
- 24) = Strada 27: Via E. Ribera
- 25) = Strada 28: Prol. di Via Pia
- 26) = Strada 29: Via I. Nievo
- 27) = Strada 30: Via Settembrini
- 28) = Strada 31: Strada G. Galilei
- 29) = Strada 32: Via Imbriani
- 30) = Strada 55: Via F. Nullo
- 31) = Strada 56: Via A. Mario
- 32) = Via Palestro-P.zza Paradiso-V.le Immacolata
- 33) = Piazza Mentana
- 34) = BNL
- 35) = Via D. Savio
- 36) = Via Lamarmora
- 37) = Via Panunzio
- 38) = Via Ten. Bufi
- 39) = Via C. Cattaneo
- 40) = Via Ten Galeppi
- 41) = Via G. Panunzio
- 42) = Parcheggio
- 43) = Strada 46 Via M. del Venezuela
- 44) = Strada 72: Via Ruvo
- 45) = Via A. Fontana

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



Nome attività	Durata	Mese 1																			Mese	
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
Formazione di manto di usura e collegamento	20 g						Z1	2		Z32	2		Z19	2		Z20	2		Z2	2		Z3
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	28 g																					
Pulizia generale dell'area di cantiere	10 g																					
Smobilizzo del cantiere	10 g																					
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	1 g																					
<b>LOTTO 1 - ZONA B</b>	30 g																					
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>	25 g																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	9 g																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g																					
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																					
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g																					
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>	1 g																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																					
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	1 g																					
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g																					
<b>Demolizioni e rimozioni</b>	26 g																					
Asportazione di strato di usura e collegamento	18 g																					
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	18 g																					
Demolizione di fondazione stradale	18 g																					
Demolizione di misto cemento	18 g																					









Nome attività	Durata	Mese 1																		Mese					
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	12 g																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																								
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g																								
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>	1 g																								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																								
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	1 g																								
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g																								
<b>Demolizioni e rimozioni</b>	37 g																								
Asportazione di strato di usura e collegamento	26 g																								
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	26 g																								
Demolizione di fondazione stradale	26 g																								
Demolizione di misto cemento	26 g																								
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	26 g																								
<b>Opere d'arte</b>	36 g																								
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	13 g																								
Cordoli, zanelle e opere d'arte	13 g																								
<b>Sede stradale</b>	37 g																								
Formazione di manto di usura e collegamento	25 g																								
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	36 g																								

Nome attività	Durata	Mese 1																		Mese						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Pulizia generale dell'area di cantiere	13 g																									
Smobilizzo del cantiere	13 g																									
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	1 g																									
<b>LOTTO 1 - ZONA F</b>	25 g																									
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>	19 g																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	7 g																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																									
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	1 g																									
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																									
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g																									
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>	1 g																									
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																									
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g																									
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g																									
<b>Demolizioni e rimozioni</b>	20 g																									
Asportazione di strato di usura e collegamento	14 g																									
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	14 g																									
Demolizione di fondazione stradale	14 g																									
Demolizione di misto cemento	14 g																									
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	14 g																									
<b>Opere d'arte</b>	19 g																									

Nome attività	Durata	Mese 1																		Mese			
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	7 g																						
Cordoli, zanelle e opere d'arte	7 g																						
<b>Sede stradale</b>	20 g																						
Formazione di manto di usura e collegamento	14 g																						
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	19 g																						
Pulizia generale dell'area di cantiere	7 g																						
Smobilizzo del cantiere	7 g																						
Smobilizzo del cantiere (Area carico/scarico)	1 g																						
<b>LOTTO 1 - ZONA G</b>	16 g																						
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>	10 g																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	1 g																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																						
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g																						
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>	1 g																						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g																						
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g																						
<b>Demolizioni e rimozioni</b>	11 g																						
Asportazione di strato di usura e collegamento	8 g																						












Nome attività	Durata	Mese 1																		Mese			
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Z19 = Strada 21: Via Pia																							
Z20 = Strada 22: Via Manzoni																							
Z21 = Strada 23: Via Pappalepore																							
Z22 = Strada 24: Via A. Saffi																							
Z23 = Strada 26: Via Zuppetta																							
Z24 = Strada 27: Via E. Ribera																							
Z25 = Strada 28: Prol. di Via Pia																							
Z26 = Strada 29: Via I. Nievo																							
Z27 = Strada 30: Via Settembrini																							
Z28 = Strada 31: Strada G. Galilei																							
Z29 = Strada 32: Via Imbriani																							
Z30 = Strada 55: Via F. Nullo																							
Z31 = Strada 56: Via A. Mario																							
Z32 = Via Palestro-P.zza Paradiso-V.le Immacolata																							
Z33 = Piazza Mentana																							
Z34 = BNL																							
Z35 = Via D. Savio																							
Z36 = Via Lamarmora																							
Z37 = Via Panunzio																							
Z38 = Via Ten. Bufi																							
Z39 = Via C. Cattaneo																							
Z40 = Via Ten Galeppi																							



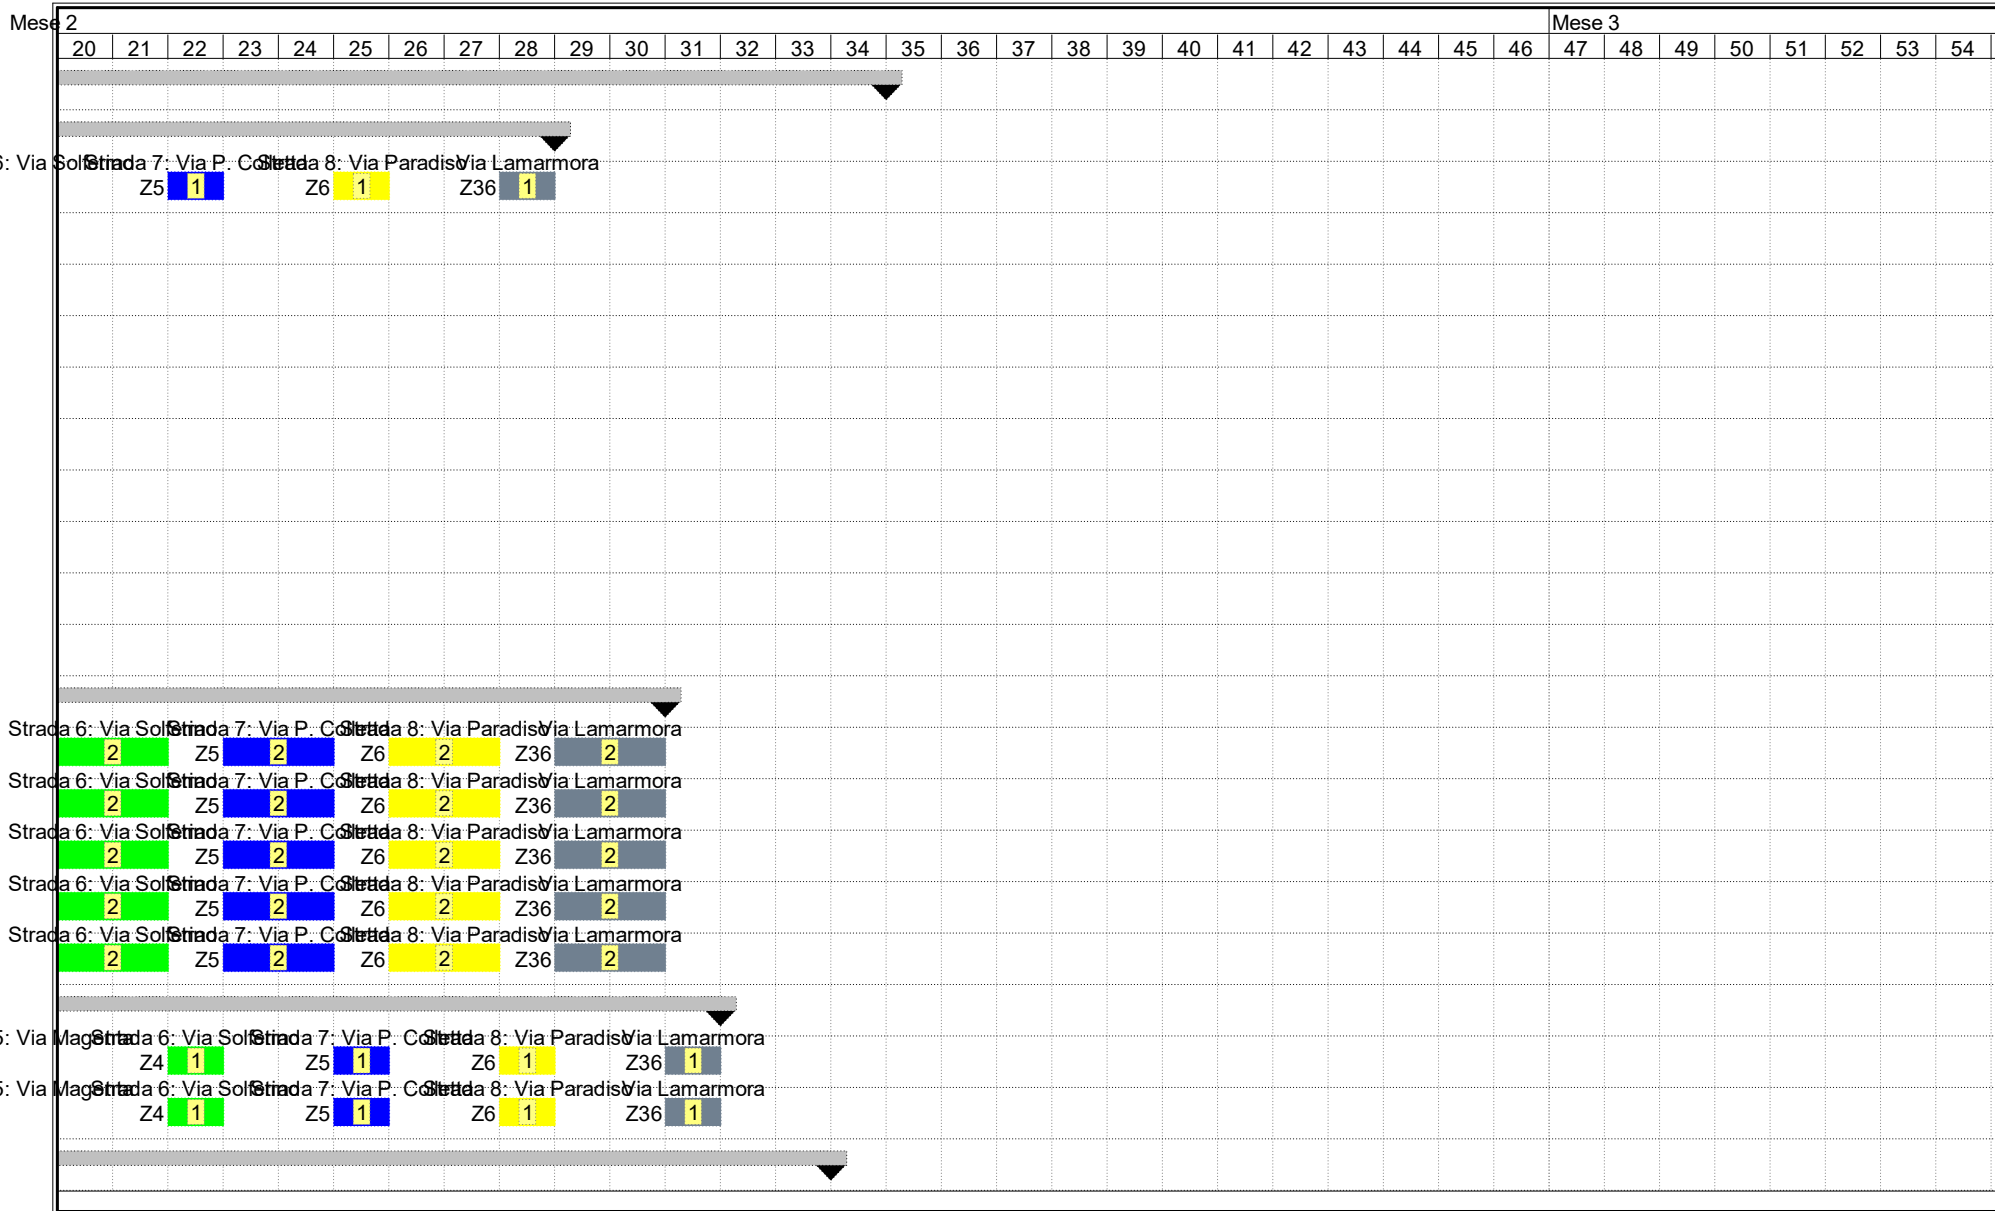




































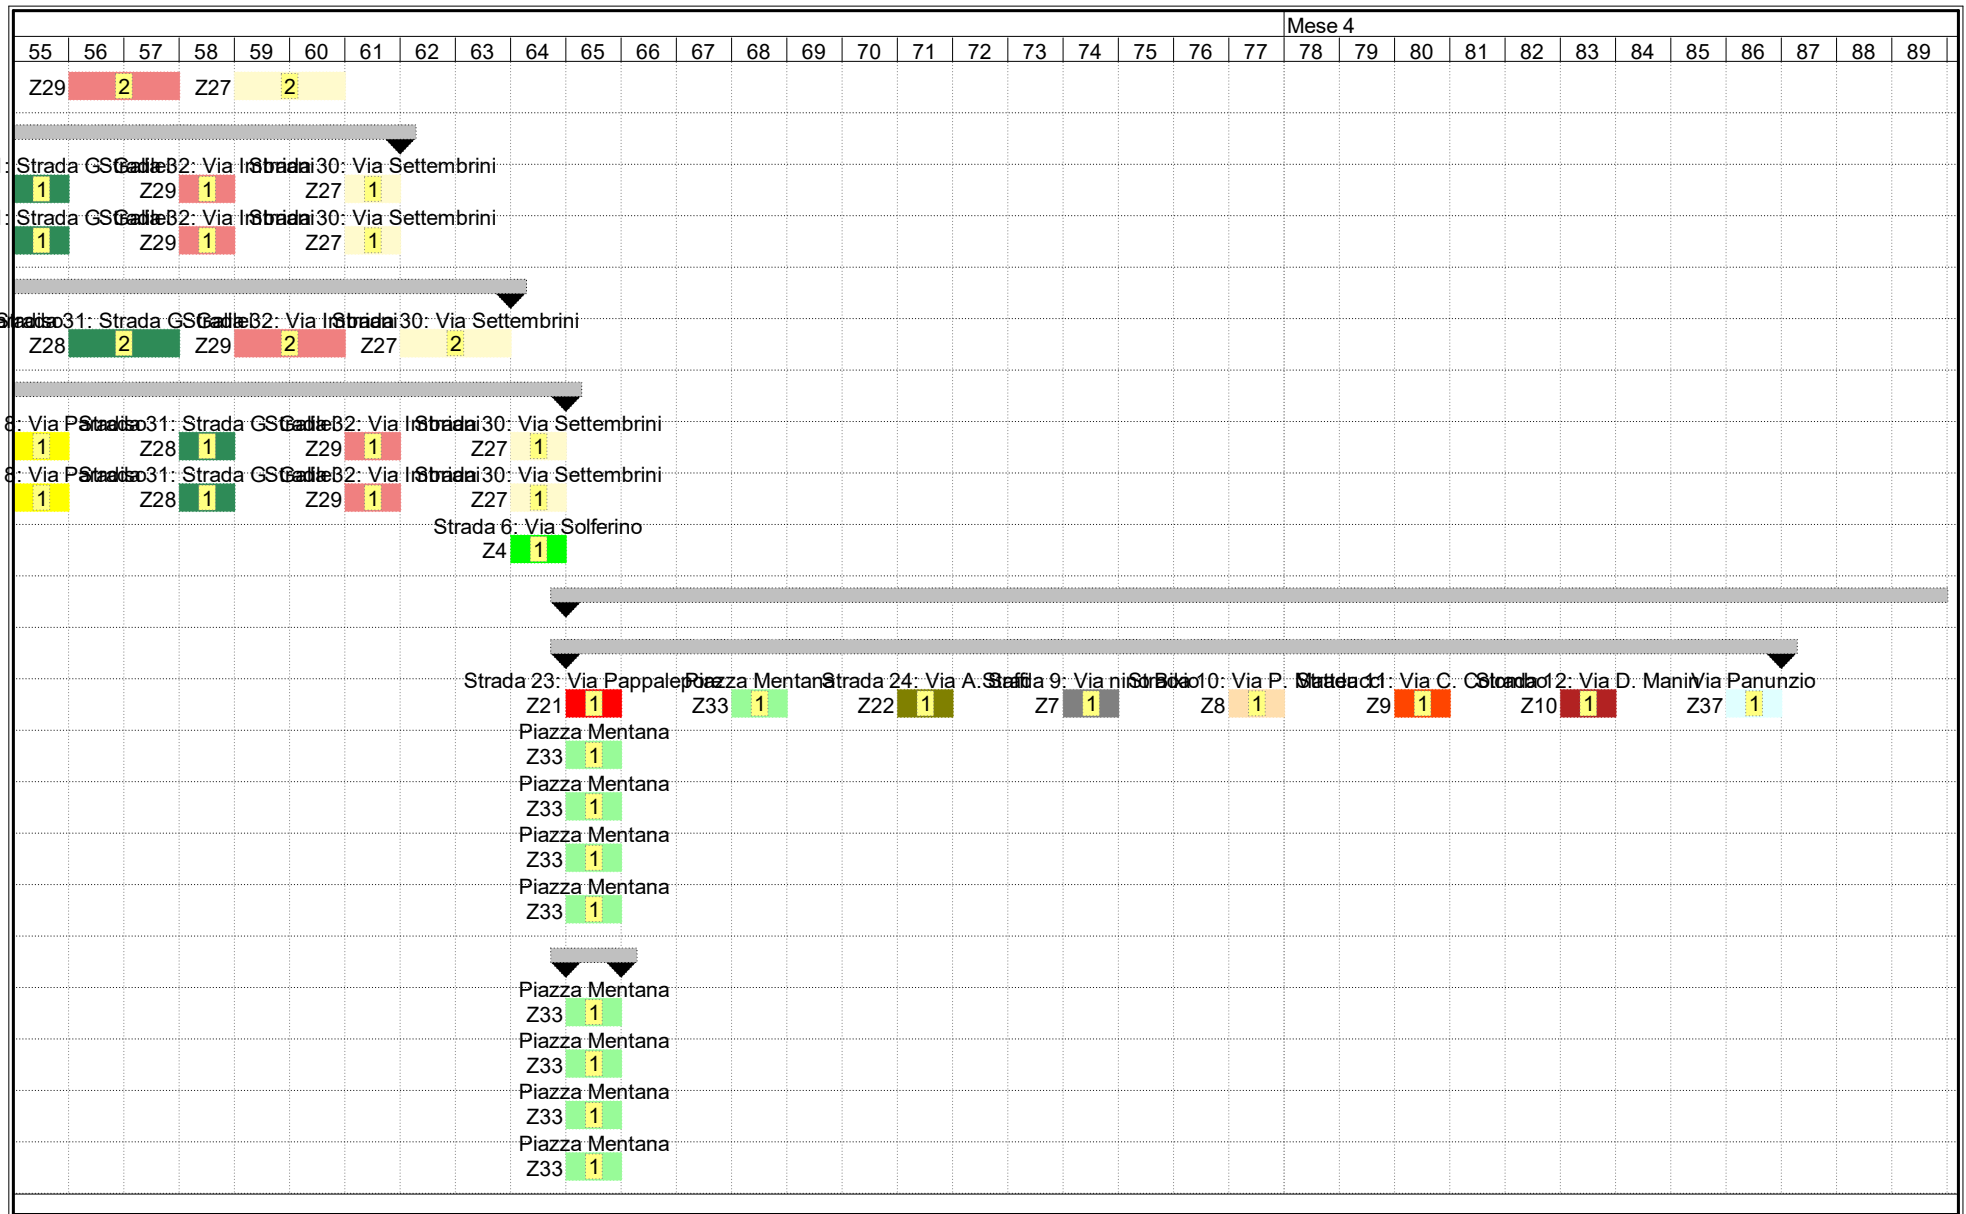

																											Mese 4											
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89				
											▼																											
											Strada 23: Via Pappalepiazza Mentana Strada 24: Via A. Staffia 9: Via ni Strada 10: Via P. Stattecl: Via C. C Strada 12: Via D. Mani Via Panunzio																											
											Z21 2 Z33 2 Z22 2 Z7 2 Z8 2 Z9 2 Z10 2 Z37 2																											
											Strada 23: Via Pappalepiazza Mentana Strada 24: Via A. Staffia 9: Via ni Strada 10: Via P. Stattecl: Via C. C Strada 12: Via D. Mani Via Panunzio																											
											Z21 2 Z33 2 Z22 2 Z7 2 Z8 2 Z9 2 Z10 2 Z37 2																											
											Strada 23: Via Pappalepiazza Mentana Strada 24: Via A. Staffia 9: Via ni Strada 10: Via P. Stattecl: Via C. C Strada 12: Via D. Mani Via Panunzio																											
											Z21 2 Z33 2 Z22 2 Z7 2 Z8 2 Z9 2 Z10 2 Z37 2																											
											Strada 23: Via Pappalepiazza Mentana Strada 24: Via A. Staffia 9: Via ni Strada 10: Via P. Stattecl: Via C. C Strada 12: Via D. Mani Via Panunzio																											
											Z21 2 Z33 2 Z22 2 Z7 2 Z8 2 Z9 2 Z10 2 Z37 2																											
											▼																											
											Strada 23: Via Pappalepiazza Mentana Strada 24: Via A. Staffia 9: Via ni Strada 10: Via P. Stattecl: Via C. C Strada 12: Via D. Mani Via Panunzio																											
											Z21 1 Z33 1 Z22 1 Z7 1 Z8 1 Z9 1 Z10 1 Z37 1																											
											Strada 23: Via Pappalepiazza Mentana Strada 24: Via A. Staffia 9: Via ni Strada 10: Via P. Stattecl: Via C. C Strada 12: Via D. Mani Via Panunzio																											
											Z21 1 Z33 1 Z22 1 Z7 1 Z8 1 Z9 1 Z10 1 Z37 1																											
											▼																											
											Strada 23: Via Pappalepiazza Mentana Strada 24: Via A. Staffia 9: Via ni Strada 10: Via P. Stattecl: Via C. C Strada 12: Via D. Mani Via Panunzio																											
											Z21 2 Z33 2 Z22 2 Z7 2 Z8 2 Z9 2 Z10 2 Z37 2																											
											▼																											
											Strada 23: Via Pappalepiazza Mentana Strada 24: Via A. Staffia 9: Via ni Strada 10: Via P. Stattecl: Via C. C Strada 12: Via D. Mani																											
											Z21 1 Z33 1 Z22 1 Z7 1 Z8 1 Z9 1 Z10 1																											
											Strada 23: Via Pappalepiazza Mentana Strada 24: Via A. Staffia 9: Via ni Strada 10: Via P. Stattecl: Via C. C Strada 12: Via D. Mani																											
											Z21 1 Z33 1 Z22 1 Z7 1 Z8 1 Z9 1 Z10 1																											



































































































